ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Menza modernizace 2NP**	**47,33 dny**	**05.06. 23**	**12.09. 23**
2	předání staveniště	0 dny	05.06. 23	05.06. 23
3	vyklizení	5 dny	05.06. 23	10.06. 23
4	bourací práce, prostupy	10 dny	10.06. 23	20.06. 23
5	hydroizolace nosné konstrukce	2 dny	18.06. 23	20.06. 23
6	sokly gastro	2 dny	20.06. 23	22.06. 23
7	zednické práce obezdívky	5 dny	20.06. 23	25.06. 23
8	zaměření gastro	1 den	20.06. 23	21.06. 23
9	hrubé rozvody TZB, žlaby	10 dny	20.06. 23	30.06. 23
10	úprava vytápění	3 dny	30.06. 23	03.07. 23
11	potěry podlah	3 dny	03.07. 23	06.07. 23
12	rozvody elektro (žlaby)	5 dny	06.07. 23	11.07. 23
13	úprava vzt	3 dny	11.07. 23	14.07. 23
14	podhled	10 dny	14.07. 23	08.09. 23
15	elektro kompletace	5 dny	24.07. 23	07.09. 23
16	požární dveře - výměna	1 den	24.07. 23	25.07. 23
17	hydroizolace stěrková	2 dny	25.07. 23	27.07. 23
18	keramické obklady	5 dny	27.07. 23	01.08. 23
19	keramické dlažby	10 dny	01.08. 23	11.08. 23
20	kompletace tzb	7 dny	11.08. 23	18.08. 23
21	nátěr VZT	3 dny	11.08. 23	14.08. 23
22	malby	8 dny	14.08. 23	22.08. 23
23	gastro dodávka a kompletace	12 dny	22.08. 23	03.09. 23
24	výměna dveřních křídel, nátěr	4 dny	30.08. 23	03.09. 23
25	úklid	3 dny	03.09. 23	06.09. 23
26	časová rezerva	6 dny	06.09. 23	12.09. 23
27	předání díla	0 dny	12.09. 23	12.09. 23

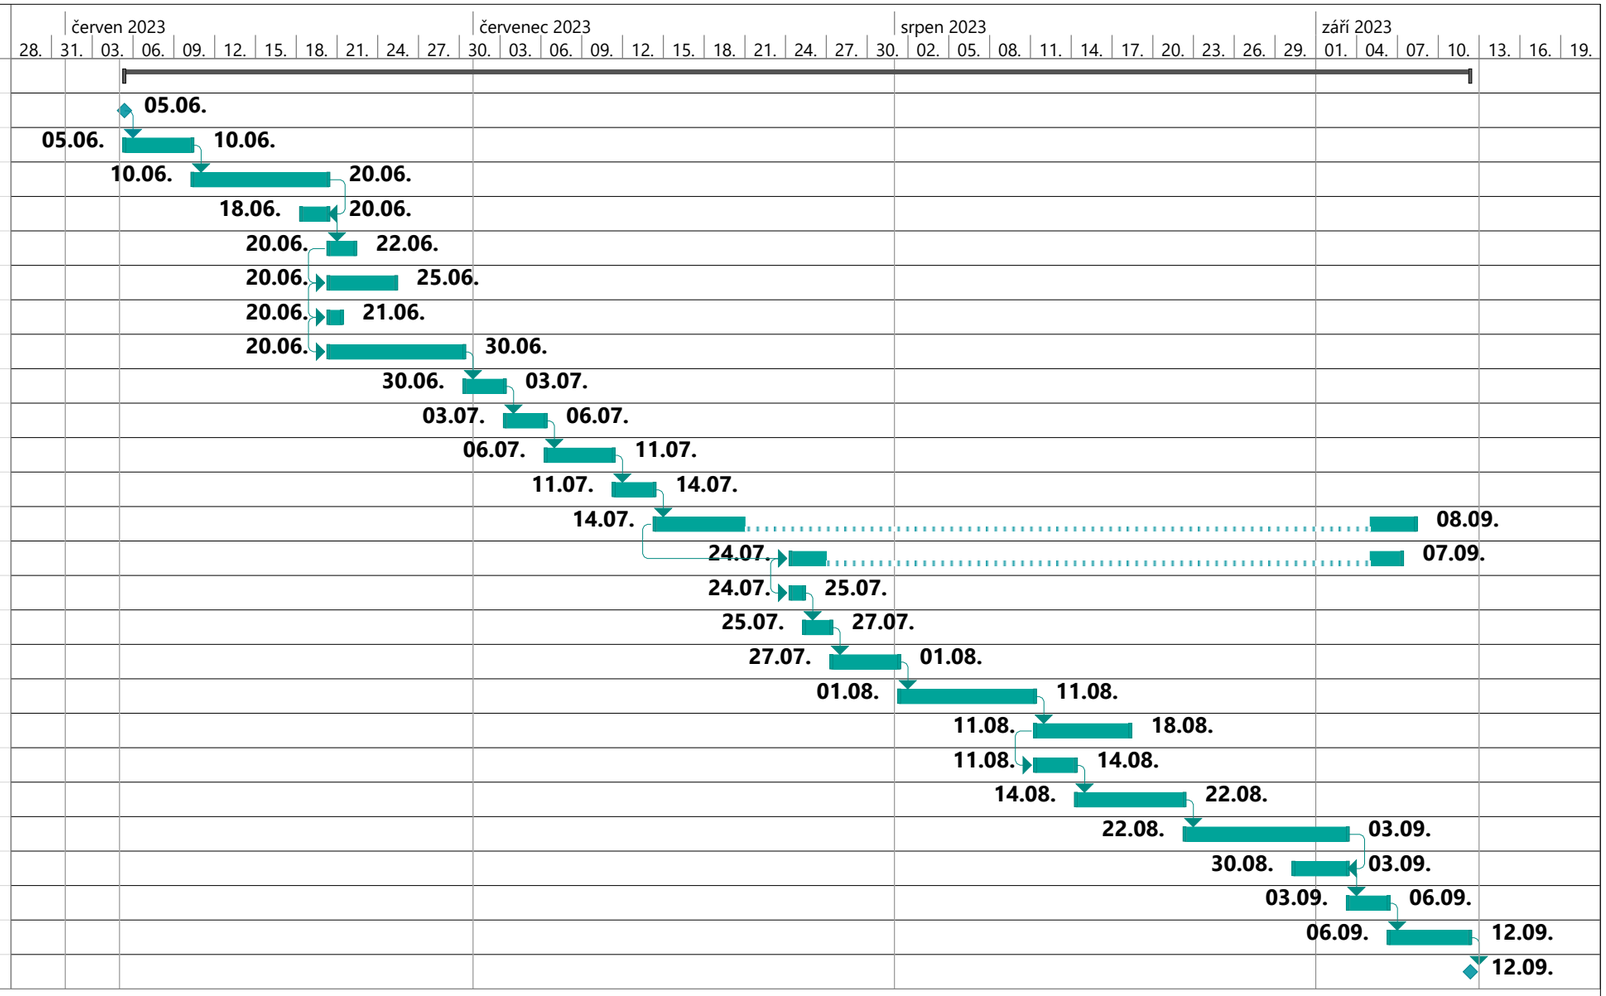

				říjen 2023										listopad 2023										prosinec 2023											leden 2024										únor 2024										březen 2024					
19.	22.	25.	28.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	02.	05.	08.	11.	14.	1
